مسیر بحرانی برنامه زمانبندی احداث مجموعه ورزشی

ID	WBS	نام فعالیت	مدت	شروع	پایان	هزینه
۰	۰	**احداث مجموعه ورزشی**	**۹۴۶ روز**	**۹۲/۰۲/۰۱**	**۹۴/۰۹/۰۱**	**ریال ۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰/۰۰**
۱	۱	شروع پروژه (تحویل زمین)	۰ روز	۹۲/۰۲/۰۱	۹۲/۰۲/۰۱	ریال۰/۰۰
۳	**۳**	**طراحی و گودبرداری**	**۹۰ روز**	**۹۲/۰۲/۰۱**	**۹۲/۰۴/۲۸**	**ریال ۱۴،۷۷۴،۴۰۰،۰۰۰/۰۰**
۴	۳,۱	خاکبرداری	۶۰ روز	۹۲/۰۲/۰۱	۹۲/۰۳/۲۹	ریال ۷،۳۸۷،۲۰۰،۰۰۰/۰
۵	۳,۲	تسطیح و رگلاژ زمین	۶۰ روز	۹۲/۰۲/۳۱	۹۲/۰۴/۲۸	ریال ۷،۳۸۷،۲۰۰،۰۰۰/۰
۶	**۴**	**فونداسیون**	**۱۱۰ روز**	**۹۲/۰۳/۱۰**	**۹۲/۰۶/۲۶**	**ریال ۳۳،۲۴۲،۴۰۰،۰۰۰/۰۰**
۷	۴,۱	اجرای بتن مگر	۶۰ روز	۹۲/۰۳/۱۰	۹۲/۰۵/۰۷	ریال ۷،۳۸۷،۲۰۰،۰۰۰/۰
۸	۴,۲	اجرای آرماتوربندی فونداسیون	۶۰ روز	۹۲/۰۳/۱۵	۹۲/۰۵/۱۲	ریال ۷،۳۸۷،۲۰۰،۰۰۰/۰
۹	۴,۳	اجرای قالب‌بندی فونداسیون	۶۰ روز	۹۲/۰۳/۲۰	۹۲/۰۵/۱۷	ریال ۷،۳۸۷،۲۰۰،۰۰۰/۰
۱۰	۴,۴	اجرای بتن‌ریزی فونداسیون	۶۰ روز	۹۲/۰۳/۳۰	۹۲/۰۵/۲۷	ریال ۷،۳۸۷،۲۰۰،۰۰۰/۰
۱۱	۴,۵	گروت ریزی و نصب صفحه ستون	۳۰ روز	۹۲/۰۵/۲۸	۹۲/۰۶/۲۶	ریال ۳،۶۹۳،۶۰۰،۰۰۰/۰
۱۲	**۵**	**اسکلت**	**۳۳۰ روز**	**۹۲/۰۶/۲۷**	**۹۳/۰۵/۲۲**	**ریال ۶۶،۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰/۰۰**
۱۳	۵,۱	اجرای بیس پلیت ستونها	۶۰ روز	۹۲/۰۶/۲۷	۹۲/۰۸/۲۵	ریال ۷،۳۸۷،۲۰۰،۰۰۰/۰
۱۴	۵,۲	ساخت و نصب ستون ها	۱۲۰ روز	۹۲/۰۷/۲۶	۹۲/۱۱/۲۵	ریال ۱۴،۷۴۲،۰۰۰،۰۰۰/۰
۱۵	۵,۳	ساخت و نصب تیرهای زنبوری و حمال	۱۲۰ روز	۹۲/۰۹/۲۶	۹۳/۰۱/۲۶	ریال ۱۴،۷۴۲،۰۰۰،۰۰۰/۰
۱۶	۵,۴	ساخت و نصب بادبندها	۶۰ روز	۹۲/۱۲/۲۶	۹۳/۰۲/۲۵	ریال ۷،۳۸۷،۲۰۰،۰۰۰/۰
۱۷	۵,۵	اجرای سقف شیبدار	۹۰ روز	۹۳/۰۱/۲۷	۹۳/۰۴/۲۳	ریال ۱۱،۰۸۰،۸۰۰،۰۰۰/۰
۱۸	۵,۶	اتصالات،جوشکاری و ضدزنگ	۹۰ روز	۹۳/۰۲/۲۶	۹۳/۰۵/۲۲	ریال ۱۱،۰۸۰،۸۰۰،۰۰۰/۰
۱۹	**۶**	**سفت کاری**	**۱۸۰ روز**	**۹۳/۰۳/۱۰**	**۹۳/۰۹/۰۵**	**ریال ۴۴،۳۲۳،۲۰۰،۰۰۰/۰۰**
۲۰	۶,۱	خاکریزی پی و پشت دیوارها	۹۰ روز	۹۳/۰۳/۱۰	۹۳/۰۶/۰۶	ریال ۱۱،۰۸۰،۸۰۰،۰۰۰/۰
۲۱	۶,۲	اجرای دیوارچینی	۹۰ روز	۹۳/۰۴/۰۹	۹۳/۰۷/۰۵	ریال ۱۱،۰۸۰،۸۰۰،۰۰۰/۰
۲۲	۶,۳	ساخت ساب فریم درها و پنجره ها	۹۰ روز	۹۳/۰۵/۰۸	۹۳/۰۸/۰۵	ریال ۱۱،۰۸۰،۸۰۰،۰۰۰/۰
۲۳	۶,۴	نصب ساب فریم و درها و پنجره ها	۹۰ روز	۹۳/۰۶/۰۷	۹۳/۰۹/۰۵	ریال ۱۱،۰۸۰،۸۰۰،۰۰۰/۰
۲۸	۸	**نازک کاری**	**۲۷۰ روز**	**۹۳/۰۷/۲۶**	**۹۴/۰۴/۲۳**	**ریال ۶۶،۴۸۴،۸۰۰،۰۰۰/۰۰**
۲۹	۸,۱	نصب درب و پنجره وشیشه	۶۰ روز	۹۳/۰۷/۲۶	۹۳/۰۹/۲۵	ریال ۷،۳۸۷،۲۰۰،۰۰۰/۰
۳۰	۸,۲	سفیدکاری	۹۰ روز	۹۳/۰۸/۲۶	۹۳/۱۱/۲۵	ریال ۱۱،۰۸۰،۸۰۰،۰۰۰/۰
۳۱	۸,۳	زیرسازی و بتونه کشی دیوارها	۹۰ روز	۹۳/۰۹/۲۶	۹۳/۱۲/۲۵	ریال ۱۱،۰۸۰،۸۰۰،۰۰۰/۰
۳۸	۱۰	اجرای تأسیسات	۱۸۰ روز	۹۳/۱۲/۲۶	۹۴/۰۶/۲۱	ریال ۲۲،۱۲۹،۲۰۰،۰۰۰/۰
۳۹	۱۱	نقاشی	۸۵ روز	۹۴/۰۵/۲۳	۹۴/۰۸/۱۵	ریال ۱۰،۴۶۵،۲۰۰،۰۰۰/۰
۴۰	۱۲	تحویل موقت	۱ روز	۹۴/۰۸/۱۶	۹۴/۰۸/۱۶	ریال۰/۰۰
۴۱	۱۳	برچیدن کارگاه	۳۰ روز	۹۴/۰۸/۰۲	۹۴/۰۹/۰۱	ریال ۳،۶۹۳،۶۰۰،۰۰۰/۰
۴۲	۱۴	پایان پروژه	۰ روز	۹۴/۰۹/۰۱	۹۴/۰۹/۰۱	ریال۰/۰۰

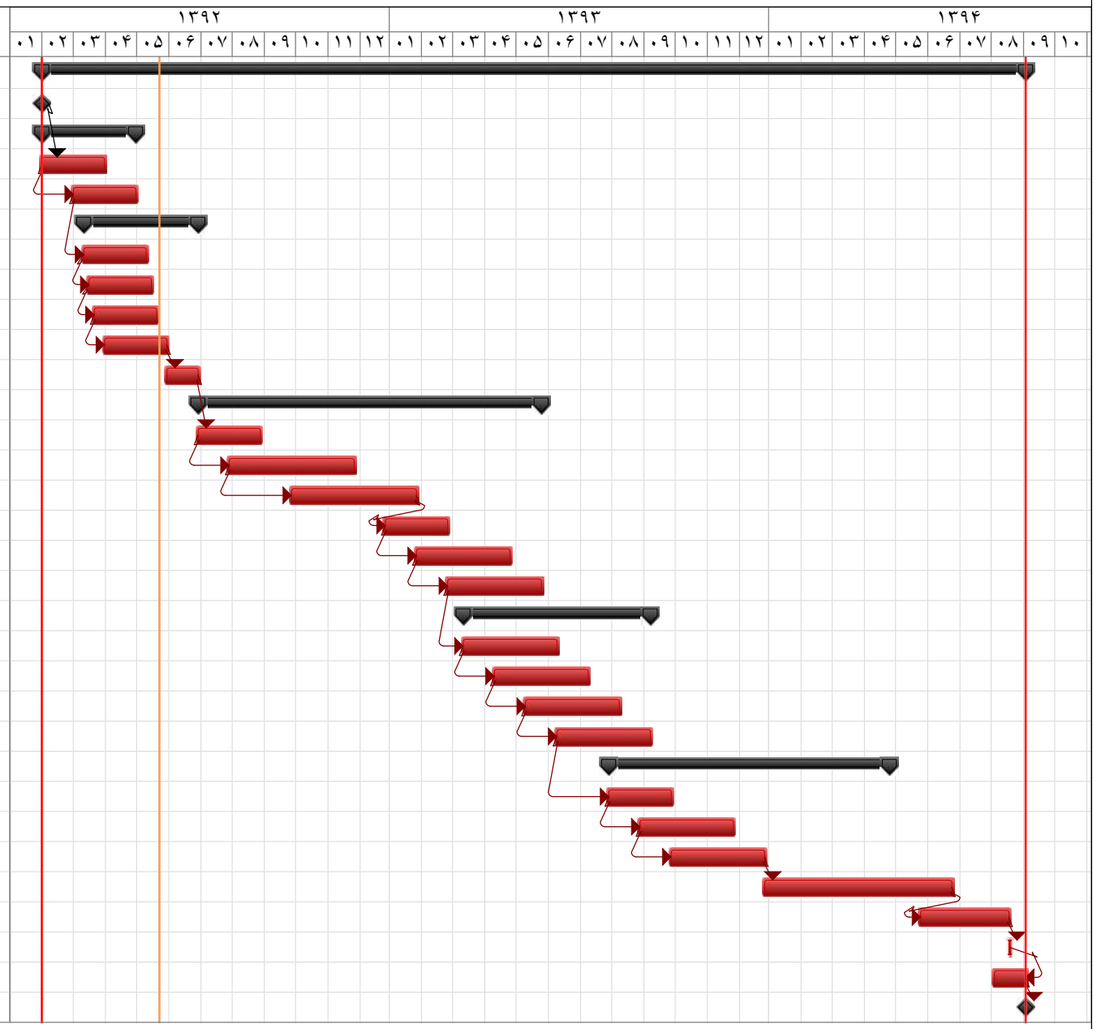

Project: احداث مجموعه ورزشی
Date: 92/05/21

Task | Split | Milestone | Summary | Critical
