نمودار درصد پیشرفت برنامه‌ای و واقعی پروژه احداث مجموعه ورزشی تا پایان تیر ماه ۹۲

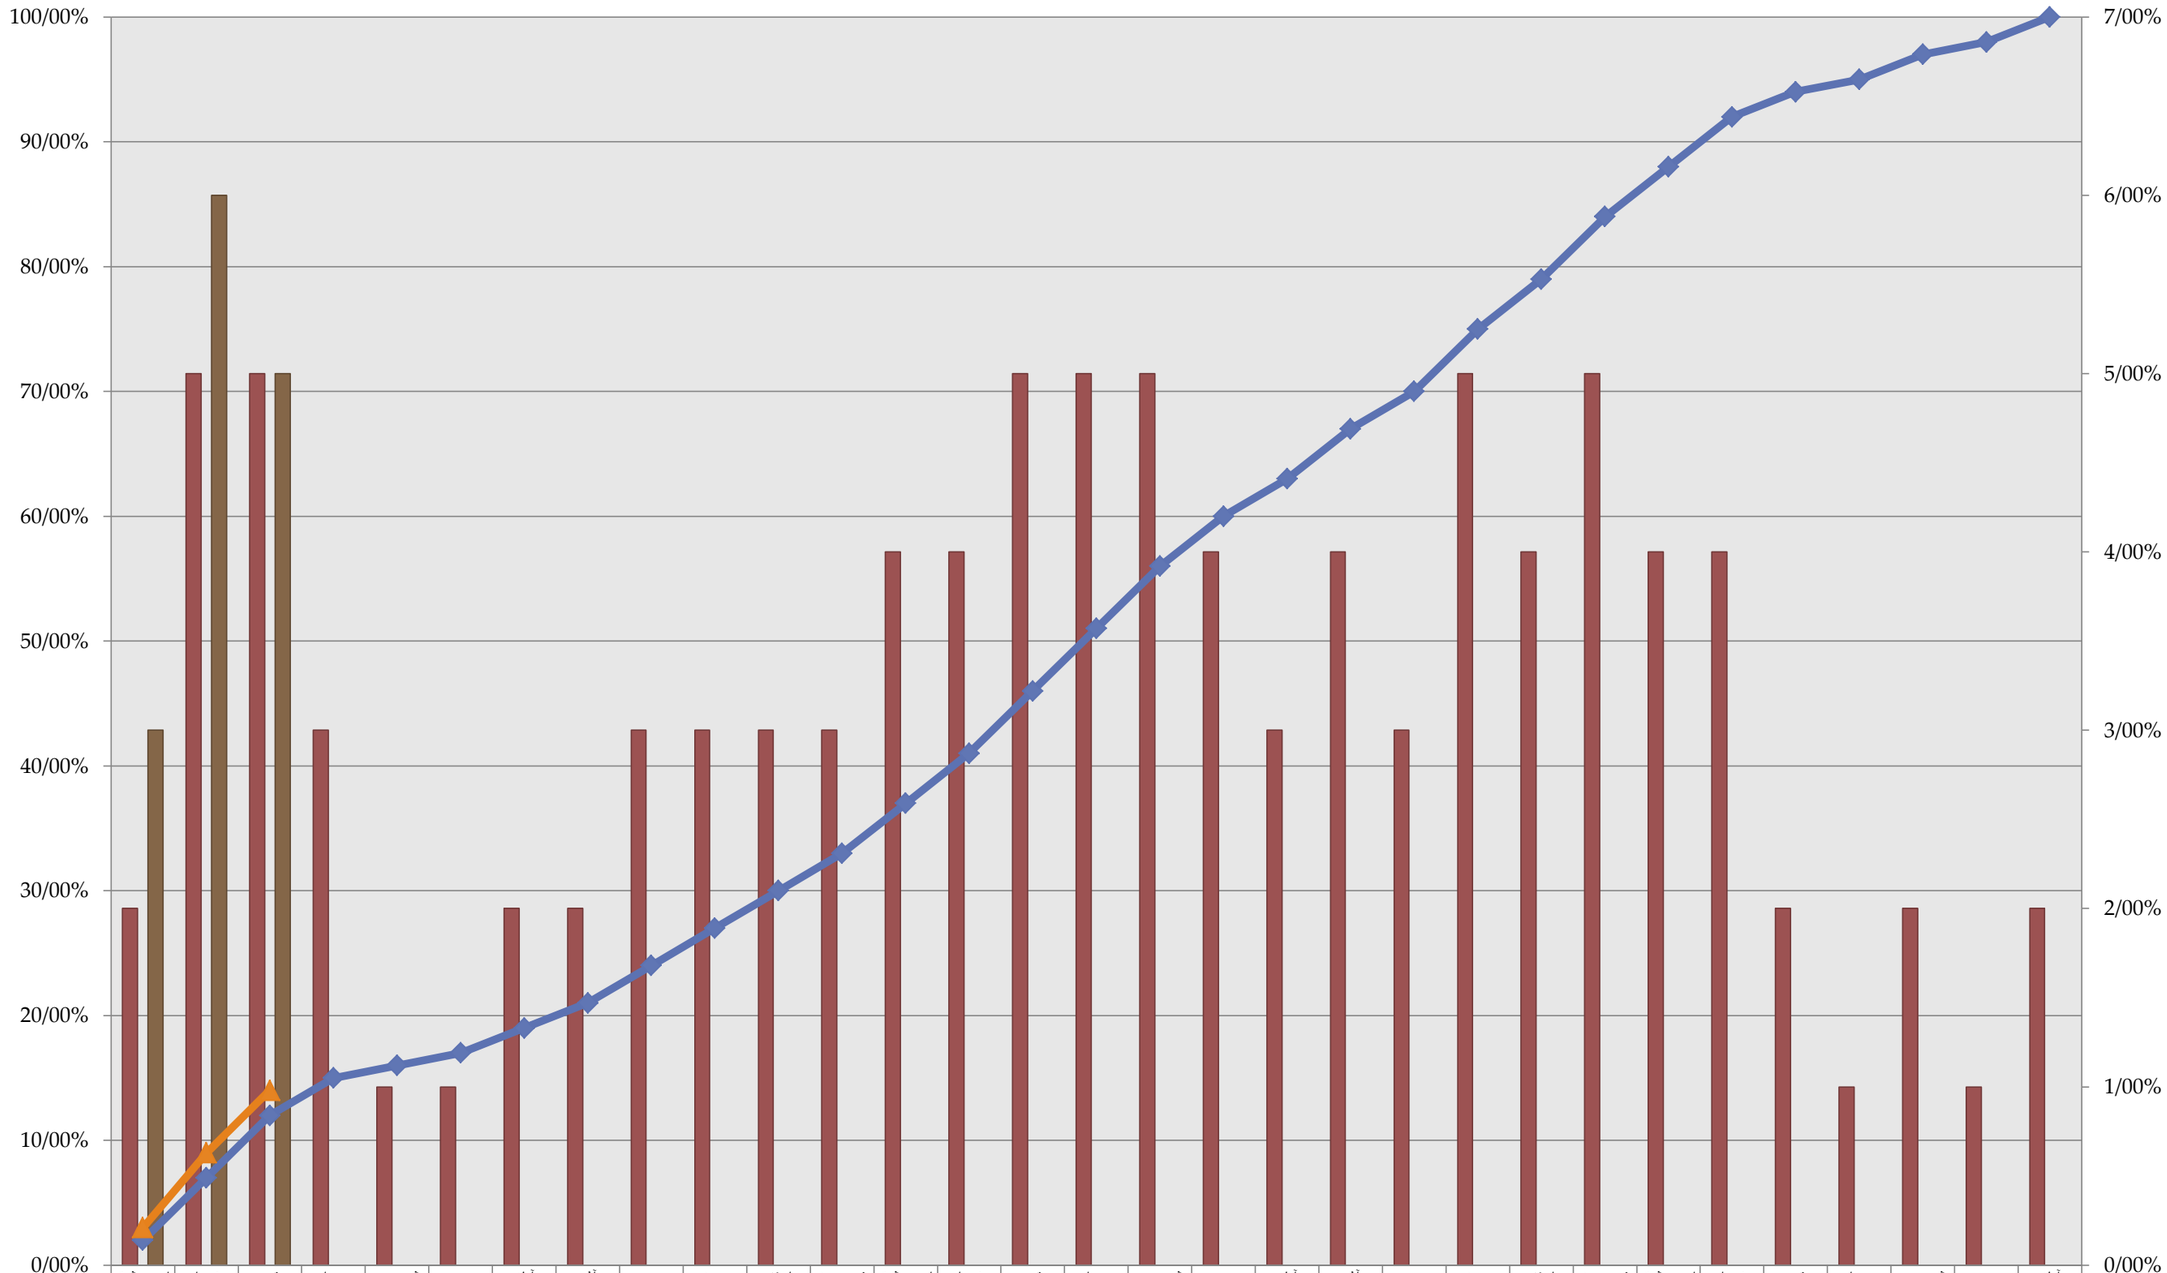

	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان
	92											93												94							
دوره اي برنامه	2/00%	5/00%	5/00%	3/00%	1/00%	1/00%	2/00%	2/00%	3/00%	3/00%	3/00%	3/00%	4/00%	4/00%	5/00%	5/00%	5/00%	4/00%	3/00%	4/00%	3/00%	5/00%	4/00%	5/00%	4/00%	4/00%	2/00%	1/00%	2/00%	1/00%	2/00%
دوره اي واقعی	3/00%	6/00%	5/00%																												
تجمعي برنامه	2/00%	7/00%	12/00%	15/00%	16/00%	17/00%	19/00%	21/00%	24/00%	27/00%	30/00%	33/00%	37/00%	41/00%	46/00%	51/00%	56/00%	60/00%	63/00%	67/00%	70/00%	75/00%	79/00%	84/00%	88/00%	92/00%	94/00%	95/00%	97/00%	98/00%	100/00%
تجمعي واقعی	3/00%	9/00%	14/00%																												
